

Informe de mantenimiento preventivo

Planta de envasado - Linea 3

1. Alcance de la intervencion

Se realizo la revision completa del grupo motriz de la linea 3 en las instalaciones de Talleres Munoz S.L. La intervencion incluyo la inspeccion del motor principal, la reductora y la bomba de trasiego P-14, asi como la sustitucion de los elementos de desgaste indicados en el apartado 3. El responsable de planta, Javier Ortega, valido los trabajos el mismo dia.

Para cualquier aclaracion puede contactar con el departamento tecnico en soporte@talleresmuno.es o en el telefono 912 445 780.

2. Observaciones detectadas

- Vibracion anomala en el acoplamiento del motor.
- Fuga leve de aceite en la brida de la reductora.
- Desgaste del rodamiento SKF-6205 del eje secundario.
- Variador SIE-4520B con aviso de sobret temperatura.

3. Material sustituido

Referencia	Descripcion	Cantidad	Precio (EUR)
SIE-4520B	Variador de frecuencia 7,5 kW	2	1.240,50
ABB-7710	Contactador tripolar 32 A	12	86,20
FES-0912	Cilindro neumatico 63x200	4	312,00
SKF-6205	Rodamiento rigido de bolas	24	18,75

4. Esquema del grupo motriz

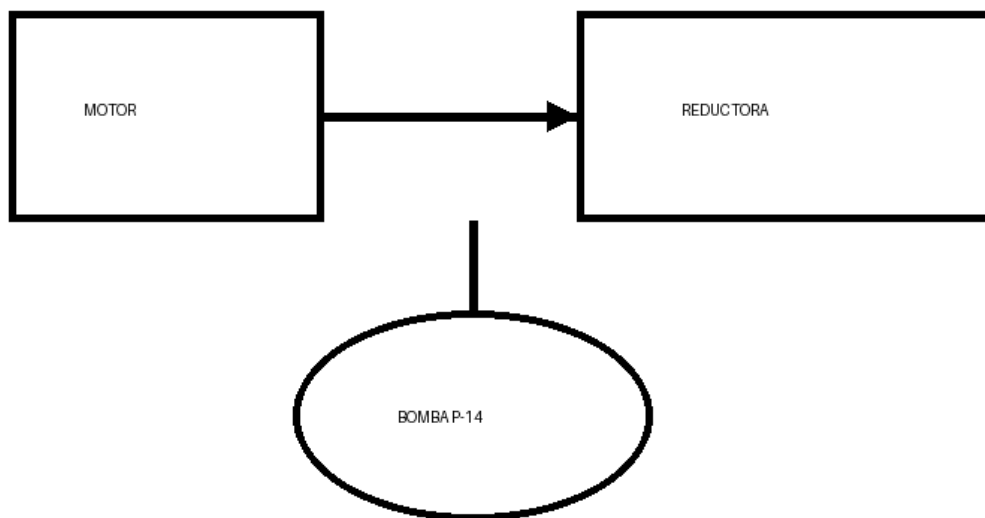


Figura 1. Disposicion de motor, reductora y bomba P-14.

5. Conclusiones

El equipo queda operativo tras la intervencion. Se recomienda repetir la medicion de vibraciones dentro de 500 horas de funcionamiento y programar la sustitucion preventiva del variador antes del proximo periodo de alta produccion.
